



Wiederherstellung und Verbesserung des Hochwasserschutzes am Simbach

Sachstandsbericht
im Rahmen der Bürgerversammlung am 07.11.2017






Überblick

- Abschnitt II
- Abbrüche
- Gesamtplanung
 - Maßnahmenkonzept
 - Planung
- Ausblick






Abschnitt II

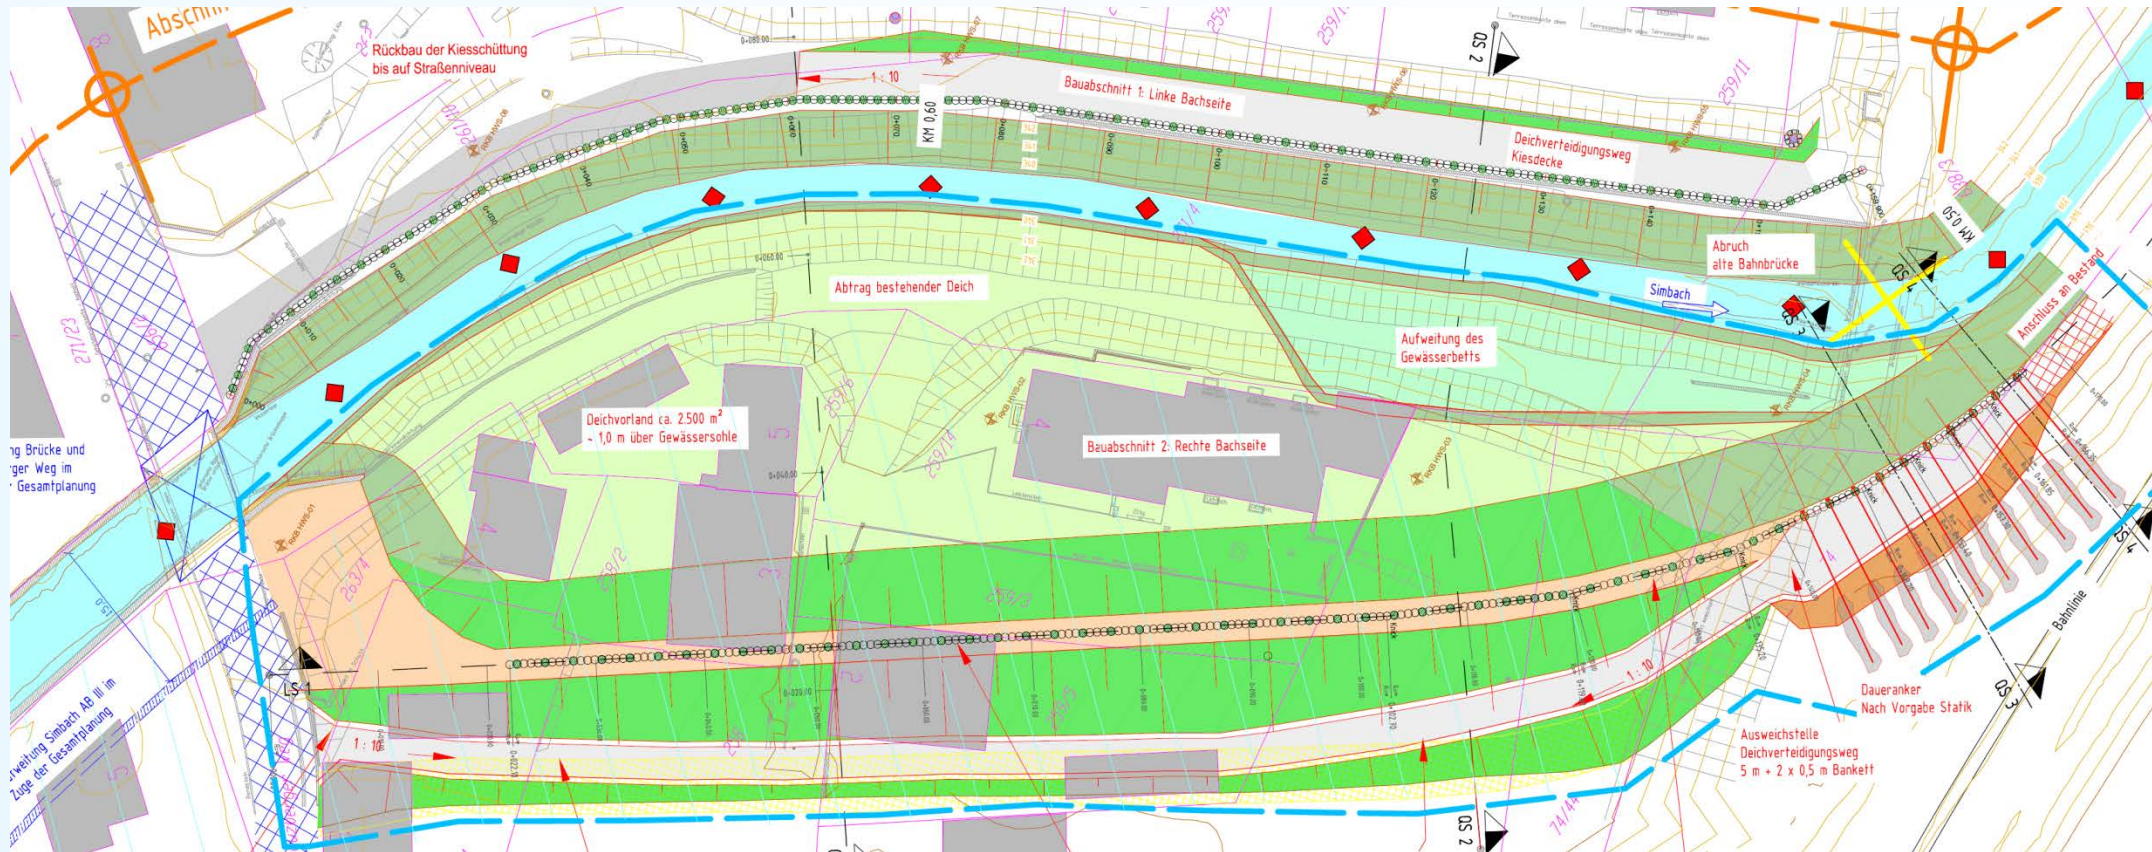



Abschnitt II - links

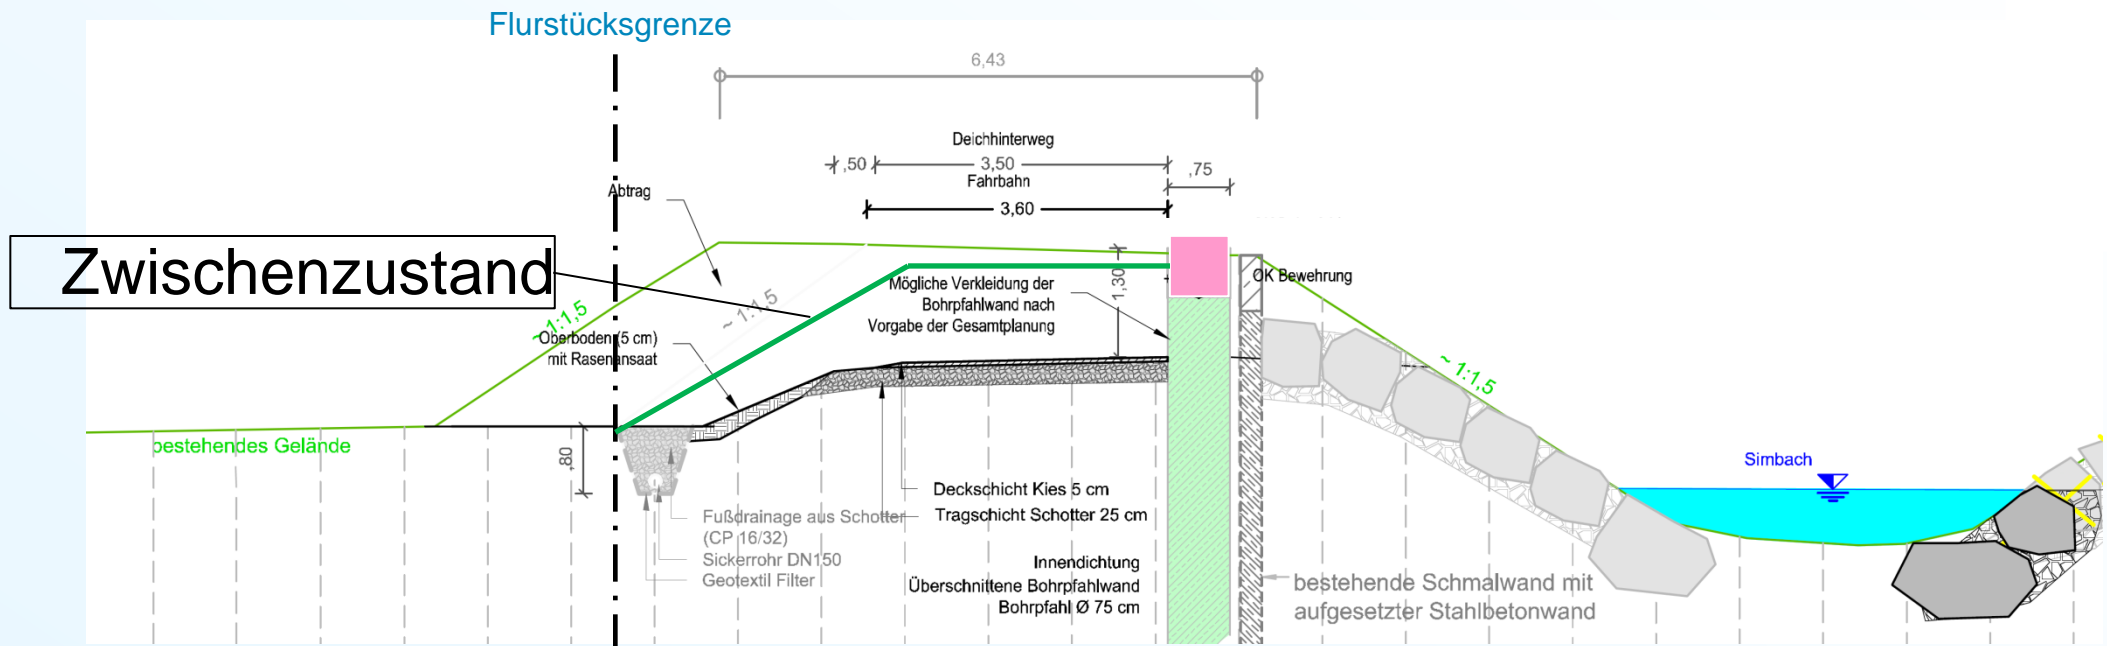



Abbrüche








Abbrüche





- Abschnitt I

-  Ausstraße 7
-  Austraße 6

- Abschnitt II

-  Wiesenstraße 4
-  Wiesenstraße 3 und 5
-  Kreuzberger Weg 4

- Abschnitt III

-  Kreuzberger Weg 5
-  Bachstraße 19b
-  Passauer Straße 8 und 10
-  Passauerstraße 13



erledigt




in der Ausführung



noch nicht begonnen



Ge

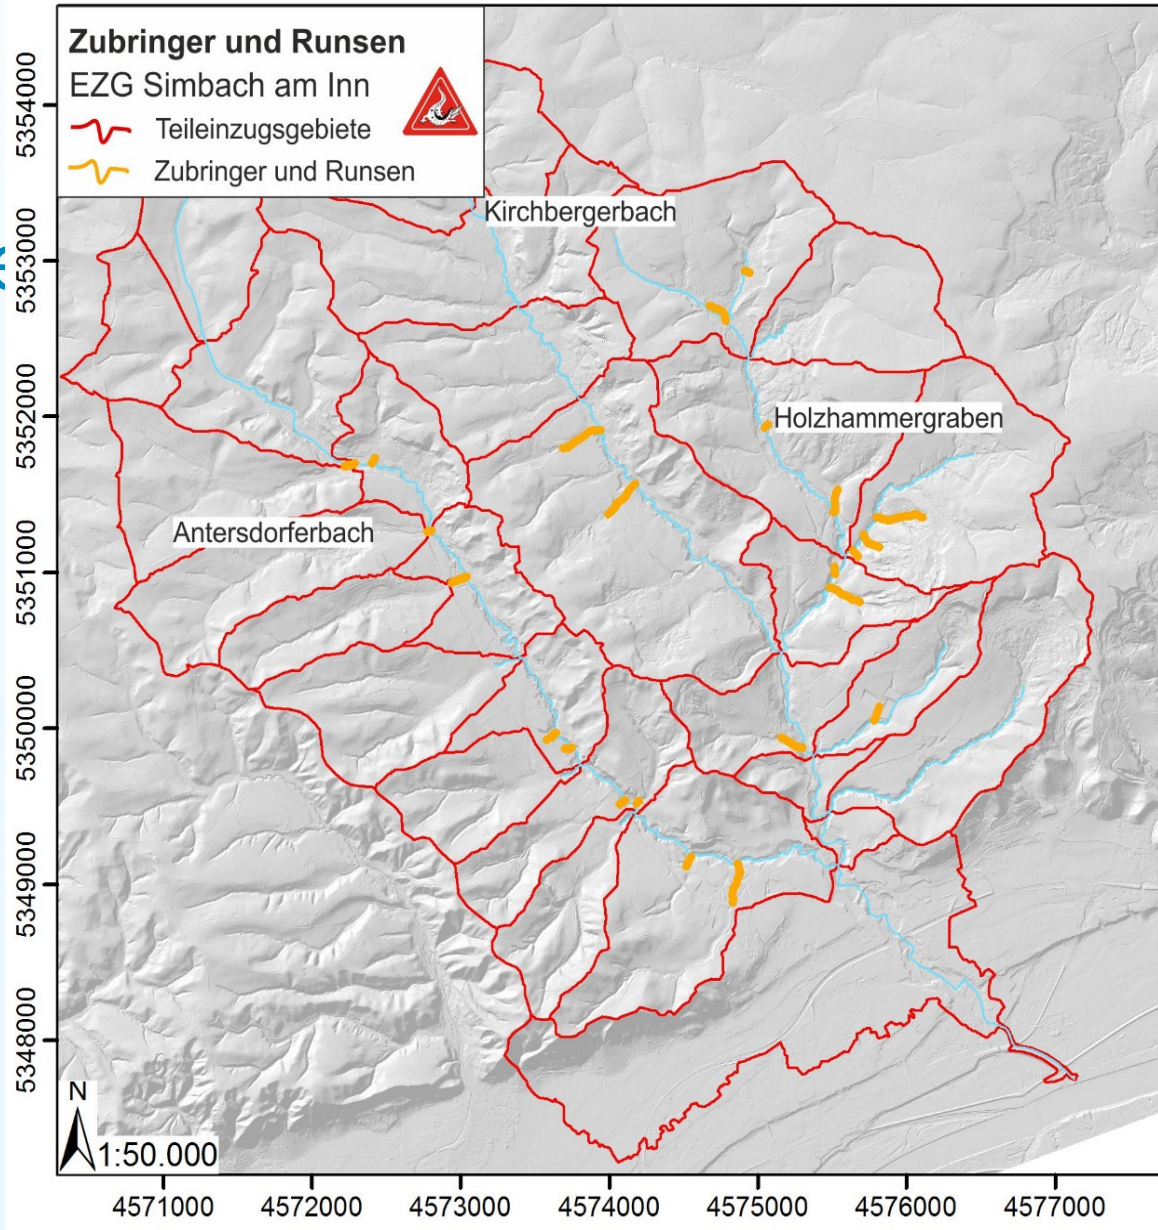

Wirtschaftsamt
Deggendorf




pt





Gesamtplanung - Maßnahmenkonzept

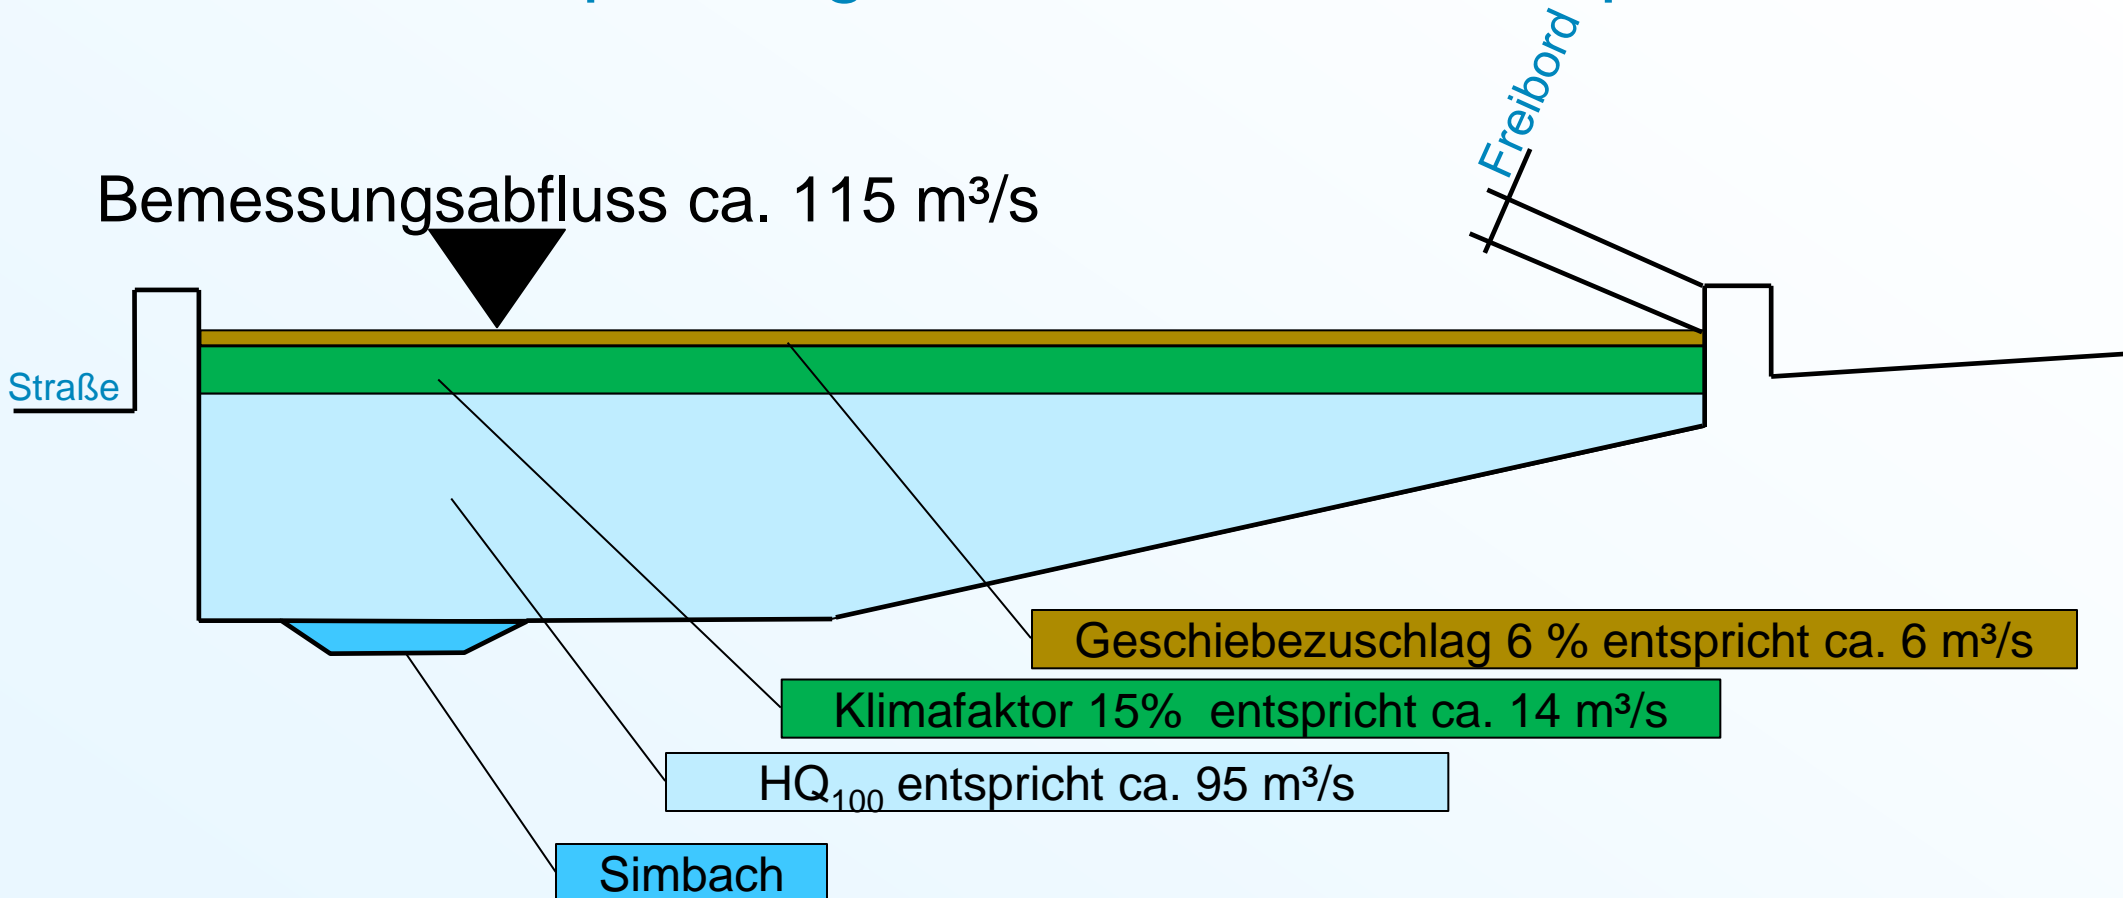




Gesamtplanung - Maßnahmenkonzept

- Erarbeitung der Mindestquerschnitte im Gewässerverlauf, sowie unterhalb der Brücken
- Grundlegender, möglicher Linienverlauf des Simbachs und der Hochwasserschutzmaßnahmen
- Erarbeitung von wasserwirtschaftlichen Grundsätzen die bei den weiteren Planungen (wasserwirtschaftlich, Städte- und Landschaftsbaulich) zu berücksichtigen sind
- Beachtung vom städte- und landschaftsplanerischem Konzept
- Betrachtung des Einzugsgebietes und eventuellem Rückhalt
- ...




Gesamtplanung - Maßnahmenkonzept

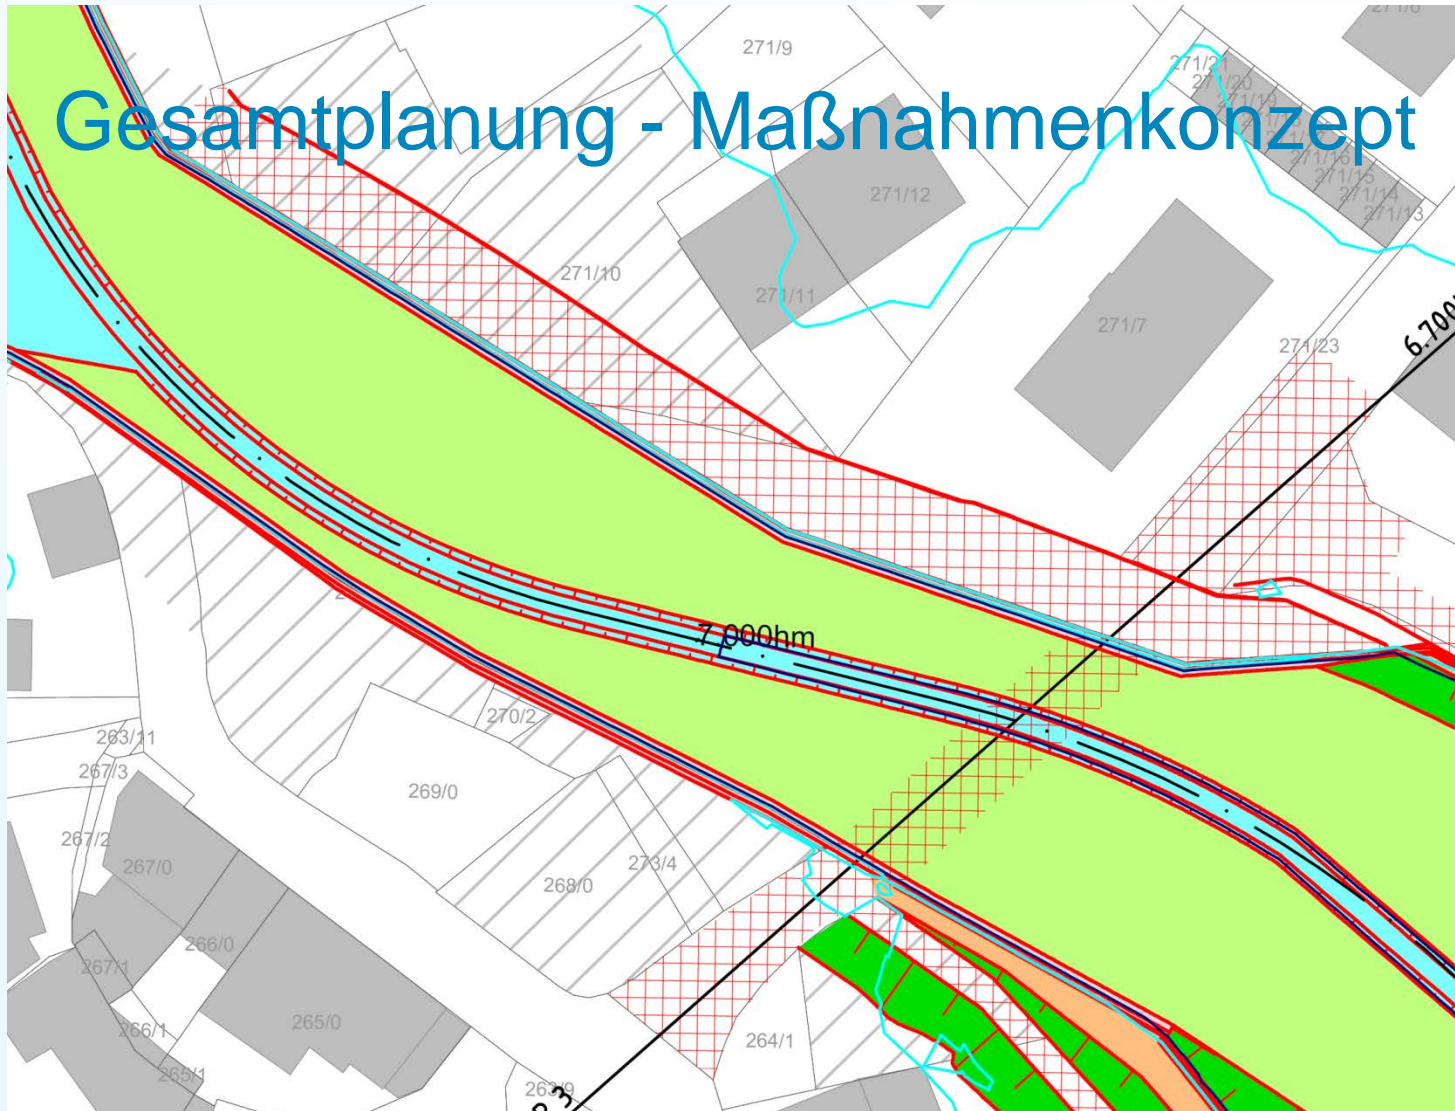



Gesamtplanung - Maßnahmenkonzept

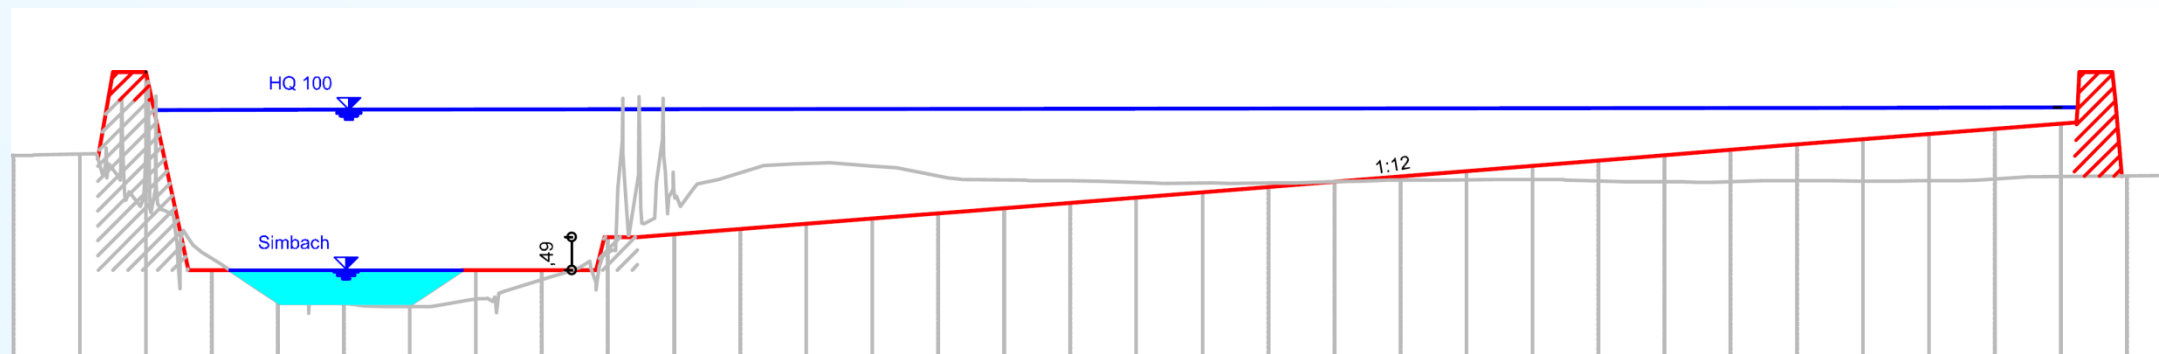



Gesamtplanung - Objektplanung

- Vergabe der Planungsleistung
 - Werner Consult, Wien
 - Auftaktgespräch am 09.11.2017



Ausblick

- Vorentwurf Gesamtplanung
- Ausschreibung der Bauarbeiten
Deichrückverlegung Abschnitt II
- Abbrüche
- Plangenehmigungsverfahren
für die Gesamtmaßnahme

Frühjahr 2018

Frühjahr 2018
2018

2018/2019
